1729 Güglingen Sanierung Sporthalle Weinsteige

Planungsbüro Knecht Ludwigsburg/Bauzeitenplan - Änderungen sind vorbehalten

Dateiname: 2022-07-28_1729 Güglingen Bauzeitenplan

Zeitraum: 30.01.2022 - 11.08.2023

Datum: 27.07.2022
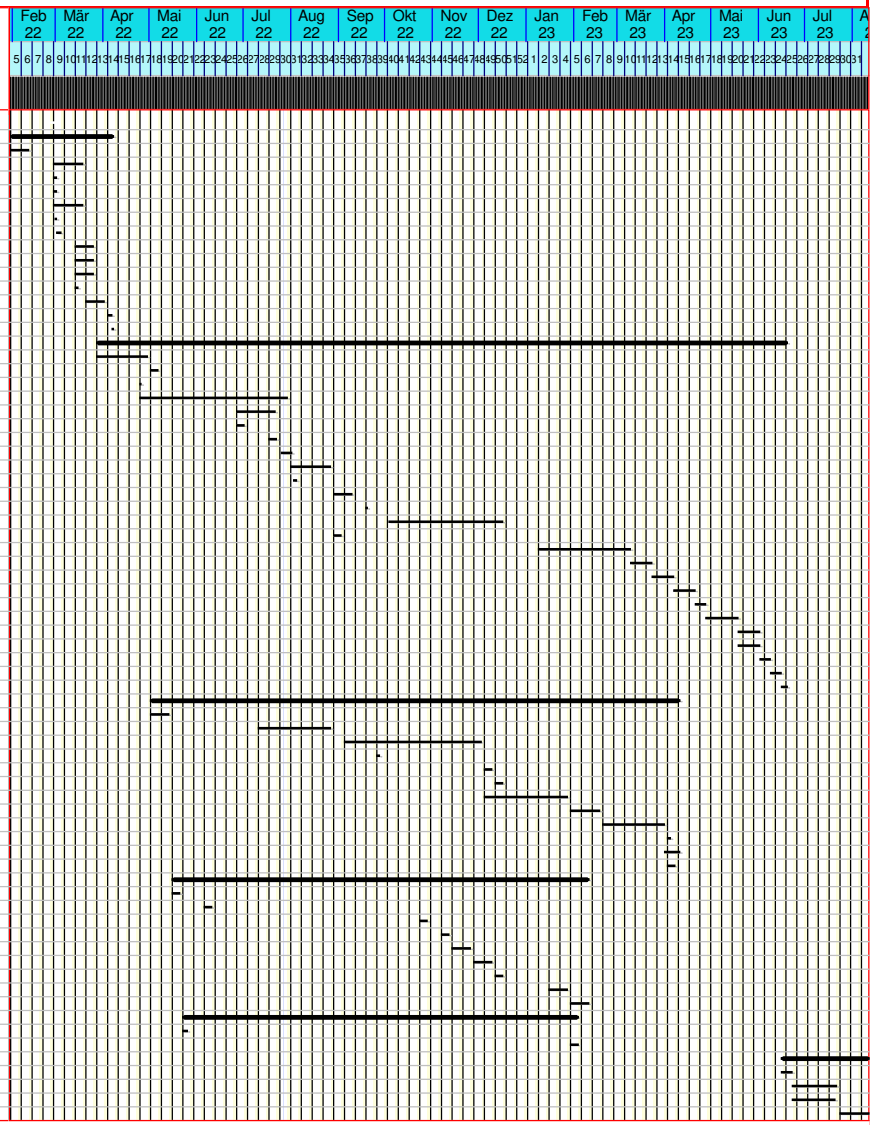
Nr.	Name	Status	S-Start	S-Ende	S-Dauer	S-Einheit	Info	Firma
1	Gemeindehalle geschlossen		28.02.2022				Bauherr	
2	**Vorbereitende Maßnahmen**		**31.01.2022**	**07.04.2022**	**39**	**AT**		
2.1	Hecke schneiden		31.01.2022	11.02.2022	10	AT	Bauherr, Bauhof	
2.2	Auslagerung Wertgegenstände		28.02.2022	18.03.2022	19	KT	Bauherr, Hausmeistrer	
2.3	Abbruch Innentüren		28.02.2022	01.03.2022	2	AT	Fa. Höfle	
2.4	Abbruch Trennvorhang		28.02.2022	01.03.2022	2	AT	Fa. Schnackenberg	
2.5	Auslagerung Möbel, Sportgeräte, Geschirr, Regale, Bänke etc.		28.02.2022	18.03.2022	19	KT	Bauherr, Hausmeister	
2.6	Bauzaun stellen, WC ?		01.03.2022	01.03.2022	1	AT	Fa. rentES	
2.7	Abbruch Regiekanzel außen		02.03.2022	04.03.2022	3	KT	Fa. HAASS	
2.8	Baustelleneinrichtung, Baustrom, Wasseranschluss		14.03.2022	25.03.2022	10	AT	Elektriker , HLS	
2.9	Demontage Elektro, überall		14.03.2022	25.03.2022	10	AT	Elektriker	
2.10	Demontage Armaturen, WC, Waschbecken etc.		14.03.2022	25.03.2022	10	AT	HLS	
2.11	Gerüstunterbau herstellen/Umkleidendach		14.03.2022	15.03.2022	2	AT	Dachdecker	
2.12	Gerüst außen stellen		21.03.2022	01.04.2022	10	AT	Gerüstbauer, alle Dachflächen	
2.13	Demontage PV-Anlage		04.04.2022	06.04.2022	3	AT	Elektriker	
2.14	Kiesabsaugung PV-Wannen		07.04.2022	07.04.2022	1	AT	Dachdecker	
3	**Halle**		**28.03.2022**	**19.06.2023**	**291**	**AT**	**Dachdecker**	
3.1	Abbruch Innen, Decke, Prallwand, Asbest etc.		28.03.2022	29.04.2022	25	AT	Abbruch	
3.2	Abbruch Lüftung Bestand?		02.05.2022	06.05.2022	5	AT	HLS Fachfirma	
3.3	Montage Schutznetze ?		25.04.2022	25.04.2022	1	AT	Dachdecker Fachfirma	
3.4	Abbruch Dachaufbau Bestand + neue Dachaufbau Halle		25.04.2022	29.07.2022	70	AT	Fa. Blummer	
3.5	Anschlüsse Hallenenwässerung		27.06.2022	21.07.2022	19	AT	Nach Absprache Fa. Blummer und Daunquart	
3.6	Demontage Elektro Bestand		27.06.2022	01.07.2022	5	AT	Fa. Weiß	
3.7	Anstrich Sportgeräte Stahlträger		18.07.2022	22.07.2022	5	AT	Fa. Metzger	
3.8	Montage DSP		26.07.2022	01.08.2022	5	AT	Fa. Zehnder	
3.9	Montage Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung		01.08.2022	26.08.2022	20	AT	Fa. Gronover, LKK, Daunquart	
3.10	Neue Verfugung - Bestandsfassade		03.08.2022	04.08.2022	2	AT	Fa. Schmid	
3.11	Montage UK-Sportgeräte + Hülsen		29.08.2022	09.09.2022	10	AT	Fa. Benz	
3.12	Verlegung Randabdichtung		19.09.2022	19.09.2022	1	AT	Sportboden	
3.13	Montage Prallwand, Tore, Türen		04.10.2022	16.12.2022	54	AT	Prallwand	
3.14	Gerüstdemontage Außen		29.08.2022	02.09.2022	5	AT	Gerüstbauer	
3.15	Verlegung Sportboden BA1		09.01.2023	09.03.2023	44	AT	Sportboden	
3.16	Asbestsanierung Tribüne		10.03.2023	23.03.2023	10	AT	Fachfirma	
3.17	Ertüchtigung Teleskoptribüne		24.03.2023	06.04.2023	10	AT	Fa. Wagner	
3.18	Verlegung Sportboden BA 2		07.04.2023	20.04.2023	10	AT	Sportboden	
3.19	Montage/Reinfahren Teleskoptrübüne		21.04.2023	27.04.2023	5	AT	Fa. Wagner	
3.20	Verlegung Sportboden BA3		28.04.2023	18.05.2023	15	AT	Sportboden	
3.21	Endmontage Prallwand		19.05.2023	01.06.2023	10	AT	Prallwand	
3.22	Endmontage Elektro/HLS		19.05.2023	01.06.2023	10	AT	Elektro/HLS	
3.23	Montage Trennvorhang		02.06.2023	08.06.2023	5	AT	Fachfirma	
3.24	Endmontage Sportgeräte		09.06.2023	15.06.2023	5	AT	Sportgeräte	
3.25	Endeinstellung der Teleskoptribüne		16.06.2023	19.06.2023	2	AT	Fa. Wagner	
4	**Umkleiden/Nebentrakt**		**02.05.2022**	**10.04.2023**	**201**	**AT**		
4.1	Abdeckarbeiten + Abbruch		02.05.2022	13.05.2022	10	AT	Abbruch	
4.2	Vormontage HLS, Elektro		11.07.2022	26.08.2022	35	AT	HLS, Elektro	
4.3	Abbruch Dachaufbau + neue Dachaufbau		05.09.2022	02.12.2022	65	AT	Dachdecker	
4.4	Montage Stahlstützen		26.09.2022	27.09.2022	2	AT	Schlosser	
4.5	Montage Stahl-UK Lüftungsgerät		05.12.2022	09.12.2022	5	AT	Schlosser	
4.6	Montage Lüftungsgerät		12.12.2022	16.12.2022	5	AT	Fachfirma	
4.7	Trockenbauarbeiten + GIS Wände		05.12.2022	27.01.2023	40	AT	Fachfirma	
4.8	Fliesenarbeiten		30.01.2023	17.02.2023	15	AT	Fliesenleger	
4.9	Malerarbeiten		20.02.2023	31.03.2023	30	AT	Fachfirma	
4.10	Montage Trennwände		03.04.2023	04.04.2023	2	AT	Fachfirma	
4.11	Endmontage Elektro/HLS		01.04.2023	10.04.2023	10	KT	Elektro/HLS	
4.12	Einbau Türblätter		03.04.2023	07.04.2023	5	AT	Schreiner	
5	**Teeküche**		**16.05.2022**	**10.02.2023**	**65**	**AT**		
5.1	Abbruch		16.05.2022	20.05.2022	5	AT	Abbruch	
5.2	Abbruch Dachaufbau Bestand + neue Dampfsperre		06.06.2022	10.06.2022	5	AT	Dachdecker	
5.3	Neuer Oberlicht/Dachanschluss		24.10.2022	28.10.2022	5	AT	Verglasungsarbeiten	
5.4	Fensterelement + Rolladen+ Ausgabetheke		07.11.2022	11.11.2022	5	AT	Verglasung	
5.5	Vormontage Elektro+ HLS		14.11.2022	25.11.2022	10	AT	Elektro, HLS	
5.6	Fliesenarbeiten/Anpassung		28.11.2022	09.12.2022	10	AT	Fliesenleger	
5.7	Malerarbeiten		12.12.2022	16.12.2022	5	AT	Fachfirma	
5.8	Ausstattung Teeküche		16.01.2023	27.01.2023	10	AT	Fachfirma	
5.9	Endmontage Elektro-HLS		30.01.2023	10.02.2023	10	AT	Elektro/HLS	
6	**Windfang**		**23.05.2022**	**03.02.2023**	**8**	**AT**		
6.1	Abbruch Bodenaufbau		23.05.2022	25.05.2022	3	AT	Abbruch	
6.2	Estricharbeiten + Winkelrahmen		30.01.2023	03.02.2023	5	AT	Fachfirma	
7	**Sonstiges**		**16.06.2023**	**11.08.2023**	**41**	**AT**		
7.1	Bodenschutzmaßnahmen entfernen		16.06.2023	22.06.2023	5	AT	Abbruch	
7.2	Abnahmen/Mängel/Restarbeiten		23.06.2023	21.07.2023	21	AT	Bauleitung/Bauherr	
7.3	Aussenanlagearbeiten?		23.06.2023	20.07.2023	20	AT	Fachfirma	
7.4	Endreinigung		24.07.2023	11.08.2023	15	AT	Fachfirma
